



Informasjon fra Peab – K. Nordang

PMV – Prosjekt MedieVolda

07.10.2019

Status

Søknad om igangsettelsestillatelse på opparbeiding av midlertidig parkeringsplass på Rotevasstomten er sendt til Volda kommune. Anslått oppstart arbeid etablering av midlertidige parkeringsplasser uke 42/43. I samme fase blir midlertidig adkomstveg til Berte Kanutte for myke trafikanter og mindre personbiler etablert på nordsiden av byggetomt for å ivareta tilkomst i byggefase. IG for oppstart på tomten til Mediebygg er også sendt til Volda kommune, oppstart på Mediebyggtomten er anslått til uke 45 forutsatt at midlertidige parkeringsplasser er opparbeidet og klar for bruk.

Arbeidstider

Hovedarbeidstider på prosjektet vil være mandag til fredag fra klokka 0700 til klokka 1900. Arbeid på lørdager kan forekomme. På helligdager vil vi ikke utføre arbeid på bygg/anleggsplassen.

Grunnarbeider

Opparbeide midlertidige parkeringsplasser på Rotevasstomten er det første vi begynner på, arbeid vil ligge i forkant av oppstart på byggetomt slik midlertidige parkeringsplasser er opparbeidet før oppstart på byggetomt. Vi begynner på byggetomten til mediebygget i begynnelsen på november.

Omlegging av fiber og rør blir prioritert. Utkjøring av masser og forberedelser for oppstart fundamentering. Grøfter og VA, EL vil gå fortløpende.

Betongarbeid

Oppstart betongarbeid i begynnelsen av desember. Vi starter i området mot nord/lavdel teknisk rom og jobber oss mot sør.

Rigg

Rigg vil bli etablert i slutten på november, men anleggsgjerder blir etablert i forkant av oppstart grunnarbeid. Midlertidige parkeringsplasser på Rotevasstomten skal være etablert før anleggsgjerder blir etablert. I samband med arbeid midlertidige parkeringsplasser etablerer vi tilkomst til Berte Kanutte på nordsiden med en midlertidig veg for gangforbindelse samt mindre kjøretøy som taxi o.l for å ivareta tilkomst til BK og SR i byggefase. Joplassveien blir i hovedsak en anleggsvei for prosjektene VCA og PMV, men vil også være kjørevei for varelevering og utrykningskjøretøy til BK og SR. Når rigg er etablert vil vi ha representanter fra prosjektorganisasjonen på byggeplass stort sett daglig, som følger opp fremdrift og sikkerhet i tomten.

Fakta om prosjektet

Peab – K. Nordang bygger Prosjekt MedieVolda, for Statsbygg. Statsbygg gjennomfører prosjektet på oppdrag fra Høgskulen i Volda.

Prosjekt MedieVolda er ett nytt utdanningsbygg for høgskulen i Volda, bygget skal samlokalisere ca 500 studenter og 50 ansatte under samme tak.

Bygget strekker seg over 2 etasjer og det skal etableres en gangforbindelse mellom ny og eksisterende bygningsmasse.

Bygget har en BTA på ca 3885 m2.

Prosjektet omfatter også utomhus arbeider rundt bygget med beplantning og parkeringsplass for sykkel og biler.

Oppstart

Oktober/ November 2019

Ferdig

Våren 2021, byggetid ca 18 mnd.

Kontaktperson entreprenør

Prosjektansvarlig Steffen Thorseth Løking
+47 986 29 999 /
steffen.loking@nordang.no

Prosjektingeniør Anders Oksavik

+47 986 19 463
anders.oksavik@nordang.no




HØGSKULEN I VOLDA
Volda University College


PEAB
K. NORDANG



STATSBYGG

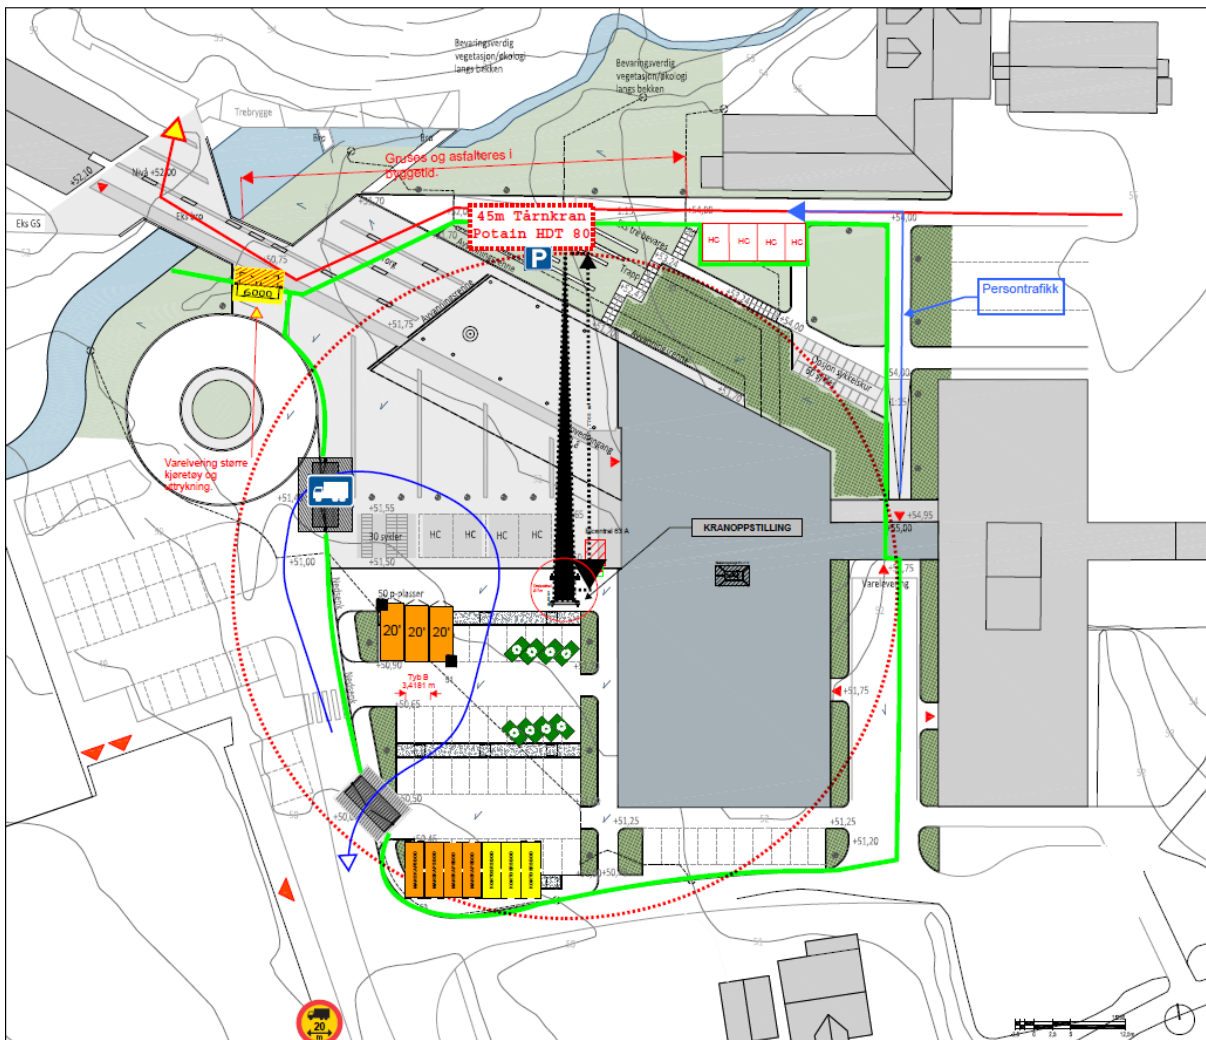

Utklipp Riggplan

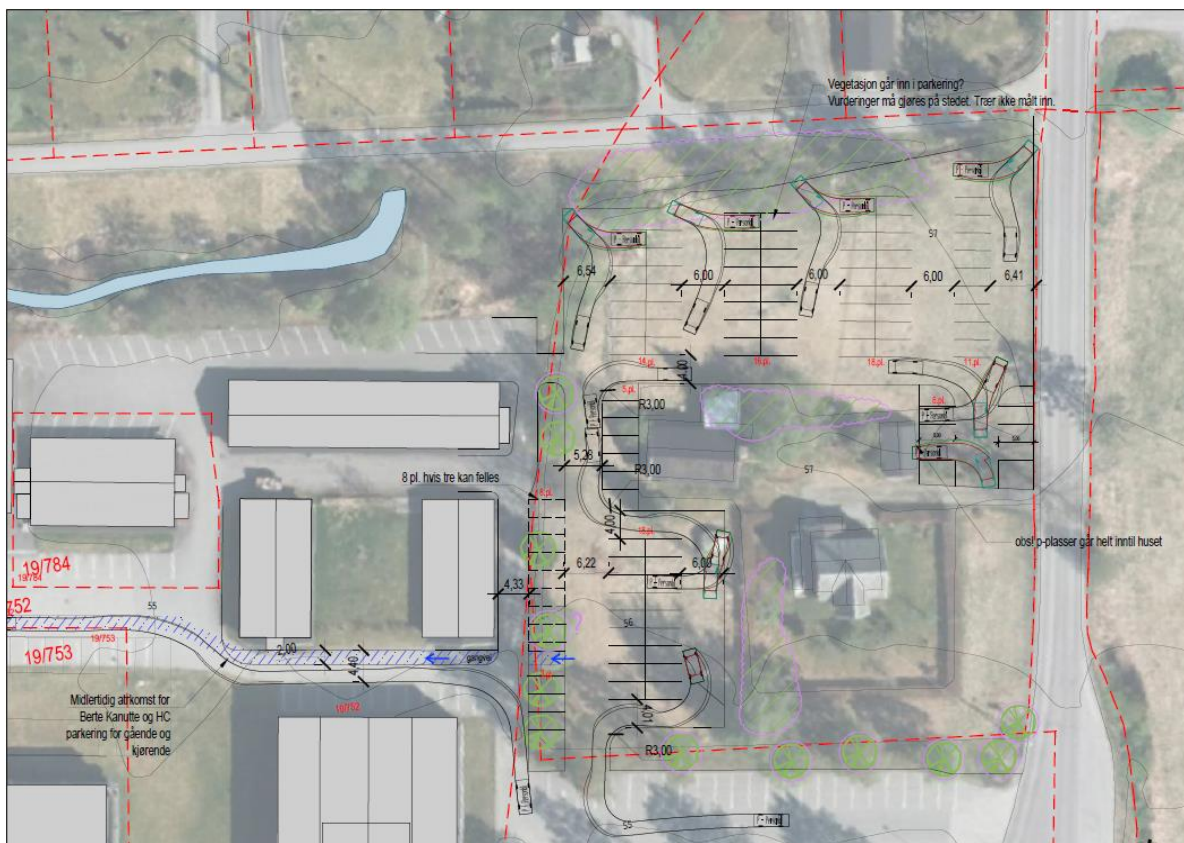

Utklipp Midlertidig parkering
